UNIVERSITE ALIOUN

Année : 2020 - 2021

CYCLE : Licence

FILIERE : D2A

UFR : SATIC

EPREUVE DE : Gestion de Proj

SESSION DE : Normale (Devoir)

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de signer leur composit

Nom et Signature du Correcteur

APPRECIATIONS : 18 EXCELLENT

Note définitive

18/20

Groupe II

1°) Serigne Mbacké Seck


2°) Abdoulaye Ndiaye

3°) Fallou Cissé

4°) Ndeynde Hecta Diong

Devoir à Rendre

1) Traçons le réseau de PERT

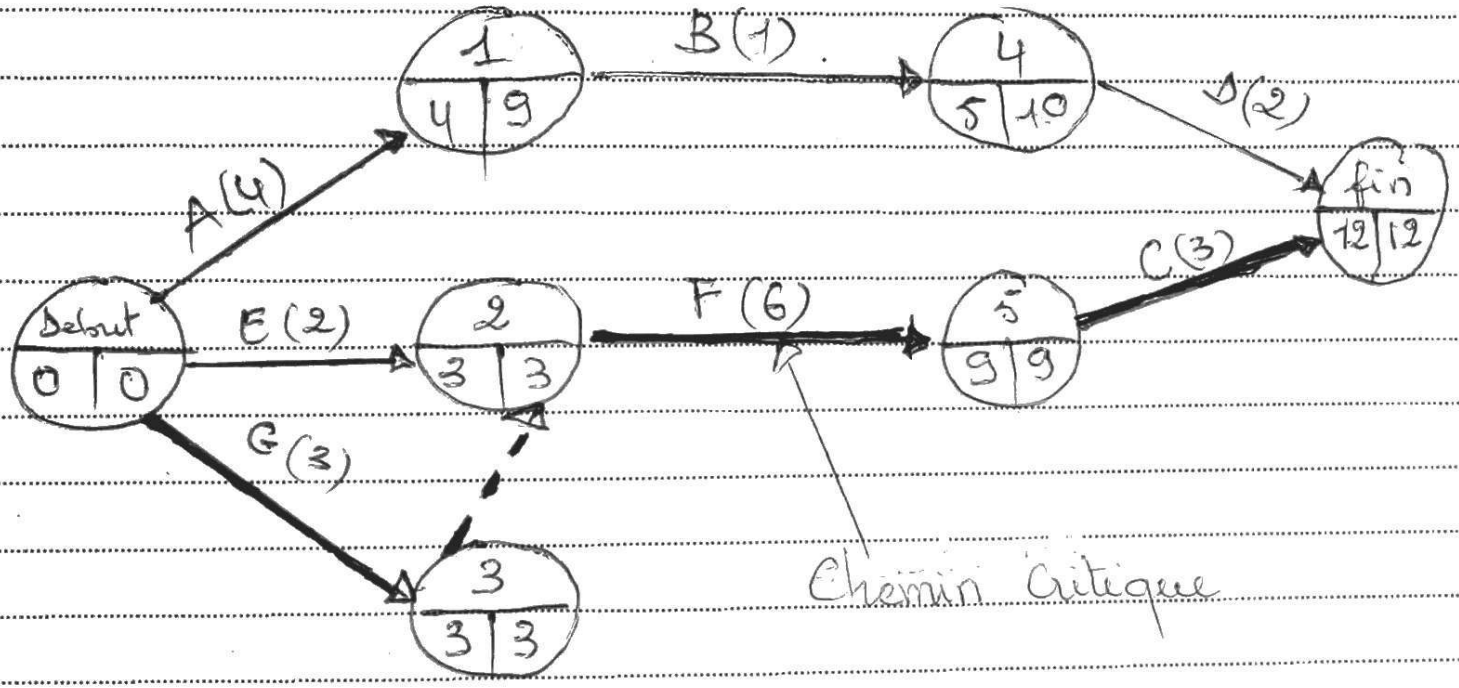

2) Calculer des dates : plus tôt et plus tard des Tâches

Tâche A :

date plus tôt = 0 + 4 = 4 semaines

date plus tard = 10 - 1 = 9 semaines

Tâche B :

date plus tôt = 4 + 1 = 5 semaines

date plus tard = 12 - 2 = 10 semaines

Tache D :

date plus tôt = 5 + 2 = 7 semaines
date plus tard = 12 semaines

Tache C :

date plus tôt = 9 + 3 = 12 semaines
date plus tard = 12 semaines.

Tache F :

date plus tôt = 3 + 6 = 9 semaines
date plus tard = 12 - 3 = 9 semaines

Tache E :

date plus tôt = 0 + 2 = 2 semaines
date plus tard = 9 - 6 = 3 semaines

Tache G :

date plus tôt = 0 + 3 = 3 semaines
date plus tard = 3 - 0 = 3 semaines

2 3) Determinons les valeurs des marges libres et Totale

- Tache A :

marge T = (9 - 0) - 4 = 5 semaines
marge L = (4 - 0) - 4 = 0 semaine

- Tache E :

marge T = (3 - 0) - 2 = 1 semaine
marge L = (3 - 0) - 2 = 1 semaine

- Tache G :

marge T = (3 - 0) - 3 = 0 semaine
marge L = (3 - 0) - 3 = 0 semaine

- Tache B :

marge T = (10 - 4) - 1 = 5 semaines
marge L = (5 - 4) - 1 = 0 semaine

- Tache F :

marge T = (9 - 3) - 6 = 0 semaine
marge L = (9 - 3) - 6 = 0 semaine

- Tache D :

marge T = (12 - 5) - 2 = 5 semaines

marge L = (12 - 5) - 2 = 5 semaines

- Tache C :

marge T = (12 - 9) - 3 = 0 semaine

marge L = (12 - 9) - 3 = 0 semaine

1 pt

4) Les Taches critiques sont :

tache G , Tache F et Tache C

1 pt


5) Voir figure (12 semaines) ??? calculs

1 pt

6) Le chemin critique et la sequence de tâches critiques, continus du debut à la fin du projet et qui détermine sa durée totale (le chemin le plus long).

3 pts

7) Traçons le diagramme de Gantt

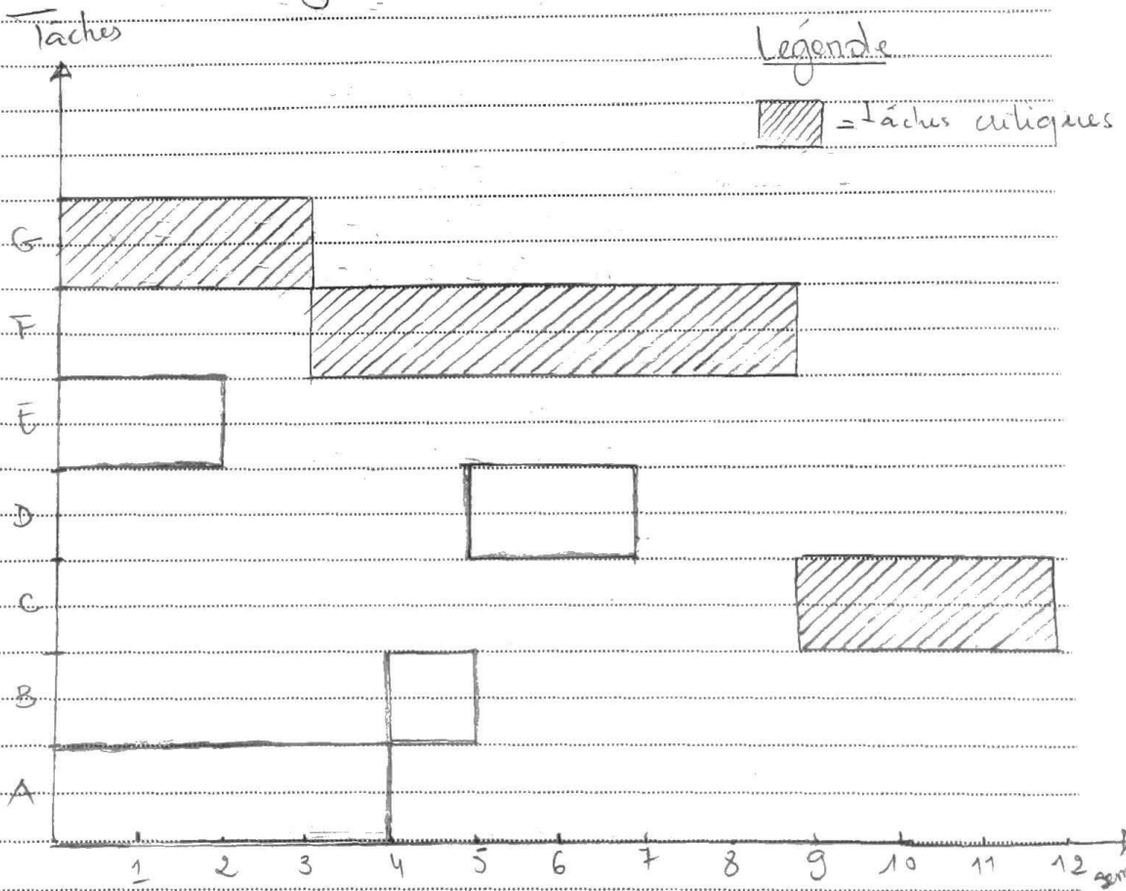

Titre : Diagramme de Gantt

8.) Non ça ne nuit pas le délai de liaison parce que la programmation de la composante 2 ne fait pas partie des tâches critiques et il ne se trouve pas sur le chemin critique.

9.) Oui ! La tâche critique fait partie du chemin critique.

10.) Oui, on peut déterminer la durée totale à partir du diagramme de Gantt parce que le chemin critique se trouve sur le diagramme de PERT et ce qui est représenté sur le diagramme de Gantt.

Groupe N°..2..

DEVOIR A RENDRE

Unité du tableau en semaine (s)

TACHES	DEBUT		DUREE	FIN		MARGE		CRITICITE
	au plus tôt	au plus tard		au plus tôt	au plus tard	Totale	Libre	
A	0s	0s	4s	4s	9s	5s	0s	
B	4s	9s	1s	5s	10s	5s	0s	
C	9s	9s	3s	12s	12s	0s	0s	X
D	5s	10s	2s	12s	12s	5s	5s	
E	0s	0s	2s	3s	3s	1s	1s	
F	3s	3s	6s	9s	9s	0s	0s	X
G	0s	0s	3s	3s	3s	0s	0s	X
